




削孔状況



造成完了後
鋼管建込状況

AMP工 施工範囲詳細図 S=1/100

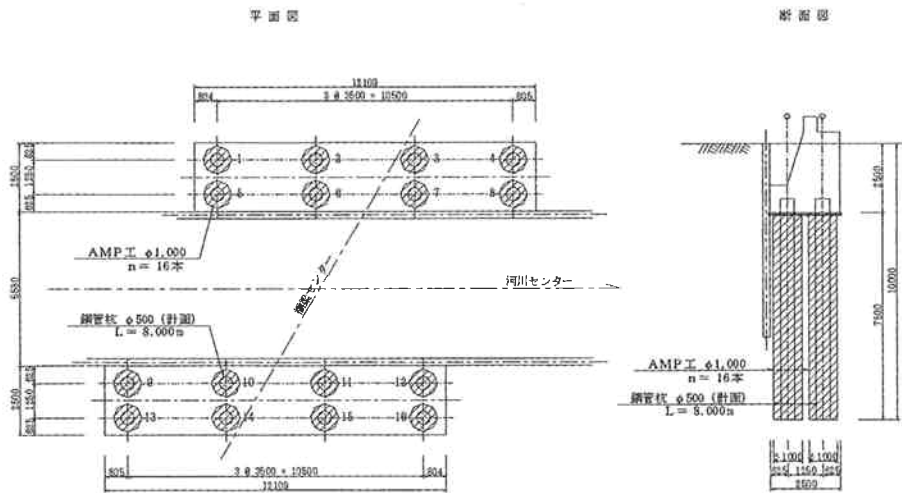

現場名称	インフラ整備計画の内の農水路統合付替他整備工事 高田川橋梁工橋台基礎工事	
発注者	民間	
施工場所	愛媛県越智郡菊間町地内	
施工時期	平成 13年 10月	
施工目的	橋梁橋台下部基礎工	
施工種別	噴射無し施工 (使用モニター径;φ1,000mm)	
土質・構成	砂質土	
施工数量改良径	φ1,000 mm	
施工本数	Σn =	16 本
削孔長	ΣL0 =	160.00 m
造成長	ΣL1 =	120.00 m
注入量	ΣQ =	24,000 ℓ
指定強度	σ =	N/m ²
室内一軸圧縮試験結果		
現場一軸圧縮試験結果		
その他・備考欄		
